建照圖說解析 × 銷售企劃合作建議

宜蘭市雙福段 768 地號住宅新建工程

地下 1 層・地上 12 層 RC 集合住宅｜44 戶｜53 汽車位



立面示意（取自請照圖「建築陰影面積檢討立面圖」，非完工實景）

起造人
向信建設有限公司・璇翔建設有限公司

設計
林建隆建築師事務所

本文件
建築基本資料分析、合作時程建議、資料需求清單

01 Key Takeaways

44 戶
2F–12F 每層 4 戶

53 汽車位
B1 30＋1F 23，車位比 1.20

507 坪
基地 1,676.29 ㎡

2,141 坪
總樓地板＋陽台 7,076 ㎡

43.05 m
簷高；層高 3.6 m

215.9 %
容積率（含容移 603 ㎡）

一句話：**宜蘭市都計住宅區、12 層 44 戶的小規模電梯大樓，賣點是「全平面車位 1.2 倍、3.6 m 層高、清水模＋木格柵立面」；最大風險是公設賣點目前建立在二工（二次施工）圖上，廣告須先做合規切割。**

1. **量體已用滿：**容積率 215.93%（上限 216%，含容積移轉 603.46 ㎡），建蔽率 48.69%（上限 60%）。產品再放大的空間幾乎為零，企劃重點在「怎麼賣」而非「改量體」。 實際
2. **產品組合兩房、三房各半：**A1／A2 兩房（室內約 20–21 坪）各 11 戶；B1 三房（約 24 坪）、B2 三房（約 32 坪）各 11 戶。預估權狀約 29–44 坪。 實際 示意
3. **車位是最強差異點：**53 位全為平面車位（無機械），比戶數多 9 位，可設計「雙車位戶」或單售車位策略。 實際 評估
4. **1F 幾乎全為停車層：**1F 813.95 ㎡ 中 699.92 ㎡ 為停車空間，大廳僅 72.36 ㎡（管委會空間）。門面感須靠入口、景觀與退縮 12.4 m 的前庭補強。 實際 評估
5. **二工家配圖與請照用途不一致：**屋突交誼廳、健身房、視聽間、B1 洗衣間等僅出現在「二工」圖層；對外廣告若直接使用，有公平交易法第 21 條不實廣告風險。 實際 評估
6. **時程取決於建照：**圖檔仍為「請照圖」（最後修改 2026/09/29）。建照核發＋預售契約備查完成前，不得刊登廣告或收訂。若能在 2027/01 下旬過關，建議搶 2027 春節返鄉檔潛銷。 實際 評估

建議下一步


#	事項	期限	承接人
1	確認合作範疇、分工與報價	2026/11/06	建商負責人＋璞域負責人
2	提供 P1 資料 8 項（見第 12 頁）	2026/11/13	建商專案窗口
3	基地踏勘：交通、學區門牌、周邊景觀與嫌惡設施	2026/11/13	璞域專案經理
4	二工清單確認會（建商、建築師、璞域三方）	2026/11/20	建商負責人＋建築師＋璞域企劃總監
5	宜蘭市電梯大樓 24 個月實價登錄與競品盤點	2026/11/27	璞域企劃總監

標註說明： 實際 取自請照圖說數據　示意 依假設推算，數字會隨建商正式資料修正　評估 企劃判斷

02 案件基本資料

工程名稱	宜蘭縣宜蘭市雙福段 768 地號 住宅新建工程
起造人	向信建設有限公司（代表人 張群威） 璀翔建設有限公司（代表人 林鎮宇）
設計建築師	林建隆建築師事務所
基地	宜蘭縣宜蘭市雙福段 768 地號 1,676.29 ㎡（507.08 坪）
使用分區	都市計畫住宅區（變更宜蘭市都市計畫第二次通盤檢討） 建蔽率 60%／基準容積率 180%
容積移轉	移入 603.46 ㎡，容積率上限提高至 216% 115/02/11 府建管字第 1150026888 號
臨路	宜興路三段 12M（已開闢），臨路長 47.505 m 留設無遮簷人行道 3.64 m
構造規模	RC 造，地下 1 層、地上 12 層、屋突 3 層 簷高 43.05 m，層高 3.6 m
用途與戶數	H-2 集合住宅，2F–12F 每層 4 戶，共 44 戶
停車	汽車 53 位（法定 26＋自設 27） B1 30 位、1F 23 位，含無障礙 2 位
申報工程造價	78,856,890 元（請照規費計算值，非實際營造成本）
圖檔狀態	請照圖；建立 2025/08/29，最後修改 2026/09/29


資料來源：請照圖圖框、法規檢討、面積計算表。 實際

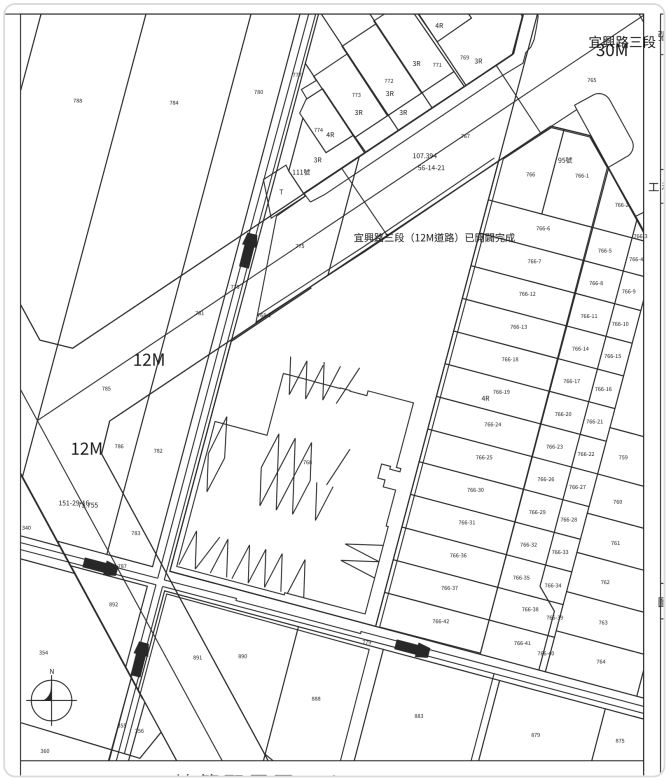

地籍配置圖（北向朝上）：基地西北側臨宜興路三段（12M，已開闢），另見「30M」道路標註，需確認是否為計畫道路。


待確認　①建照字號與核發日　②「30M」標註道路之計畫寬度與開闢時程　③雨水滯洪檢討使用基地面積 1,679.12 ㎡，與土地使用強度 1,676.29 ㎡ 不一致　④學區（周邊資料指向新生國小／宜蘭國中，需以門牌向教育處確認）

03 土地使用強度

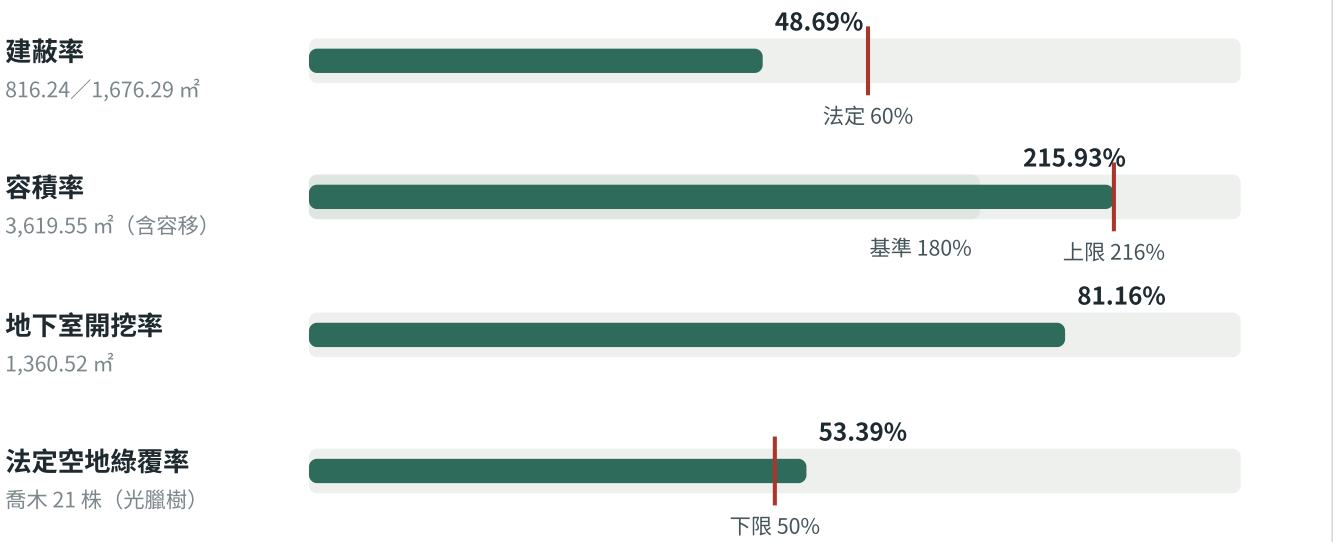

項目	㎡	坪
基地面積	1,676.29	507.08
建築面積	816.24	246.91
法定空地（實設）	860.05	260.17
容積樓地板	3,619.55	1,094.91
其中容積移轉移入	603.46	182.55
總樓地板面積	6,637.03	2,007.70
陽台面積合計	439.24	132.87
合計（總樓地板＋陽台）	**7,076.27**	**2,140.57**


容積移轉許可：115/02/11 府建管字第 1150026888 號。雨水滯洪 126.17 m³（法定 75.56 m³）。 實際

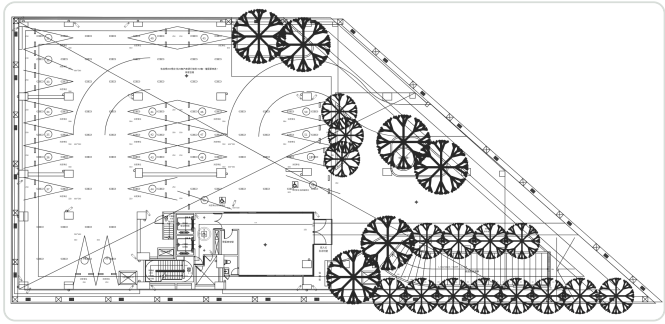


一層綠化平面圖：斜邊為宜興路三段側，喬木沿斜邊與東側帶狀配置；塔樓距建築線 12.405 m。

企劃解讀　容積已用到 99.97%，基地多出的面積轉為 1F 停車與前庭綠帶。「退縮 12 公尺、綠覆 53%」可包裝為入口前庭，是 1F 無店面、無挑高大廳的補償型賣點。 評估

04 量體與樓層配置

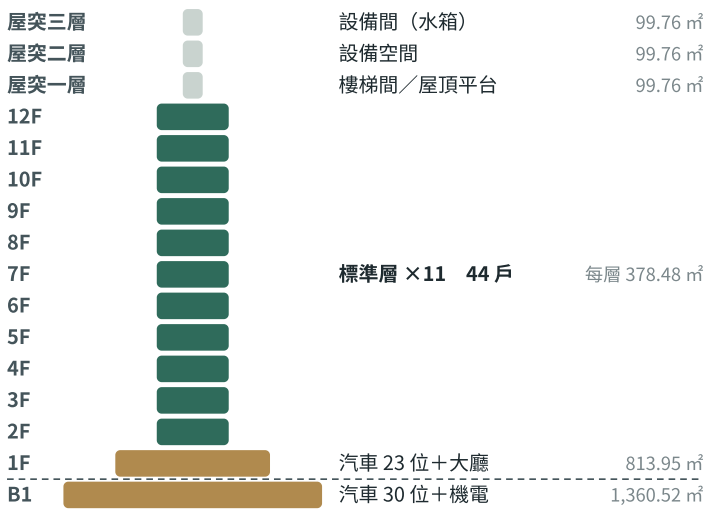


寬度依各層樓地板面積等比例繪製；虛線為地面線（GL ±0）。 實際

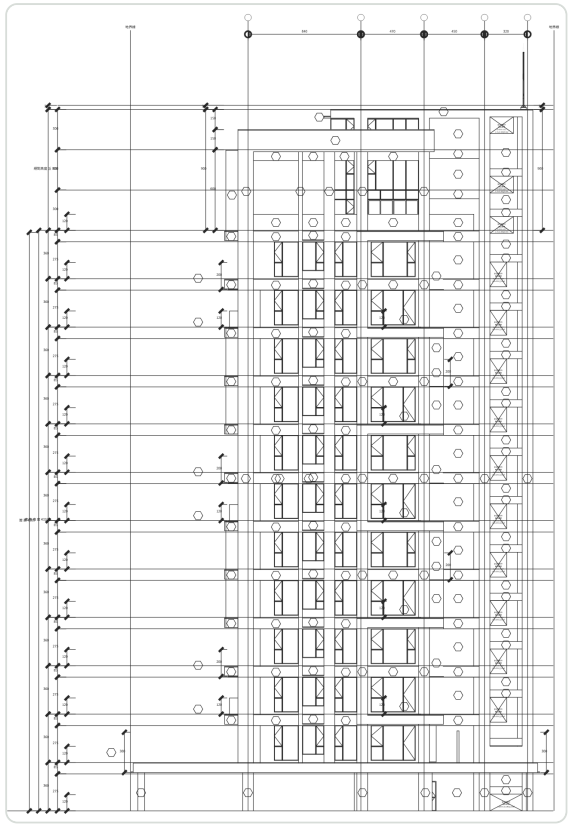

南向立面圖（請照圖 A3-01）。外牆：深灰耐候塗料、清水模、木色耐候塗料、木色烤漆鋁格柵；欄杆 H=120 cm 清／黑玻璃。

項目	內容	企劃意義
層高	各層 3.6 m（立面標註 360 cm）；屋突各 3.0 m；排煙室天花 305 cm 實際	宜蘭市大樓常見 3.2–3.4 m，3.6 m 層高可作為空間感賣點，需確認室內淨高與梁深 評估
垂直動線	電梯 2 部（緊急昇降機、無障礙），各 12 人份 90 m/min；戶外安全梯 2 座 實際	每部電梯服務 22 戶，候梯時間友善；戶外梯自然通風 評估
結構與基礎	RC 造；筏式基礎（深 1.7 m，兼雨水滯洪）；含地質改良、開挖支撐與觀測系統圖 實際	宜蘭市地質需改良，可轉為「看得見的結構安全」說明素材 評估
隔音	分戶樓板採鎖扣式隔音地板（衝擊音合規）；電梯井與居室分隔牆 RC 20 cm 實際	大樓客最常問的生活品質題，可在說明書單獨成頁 評估

05 標準層與戶型

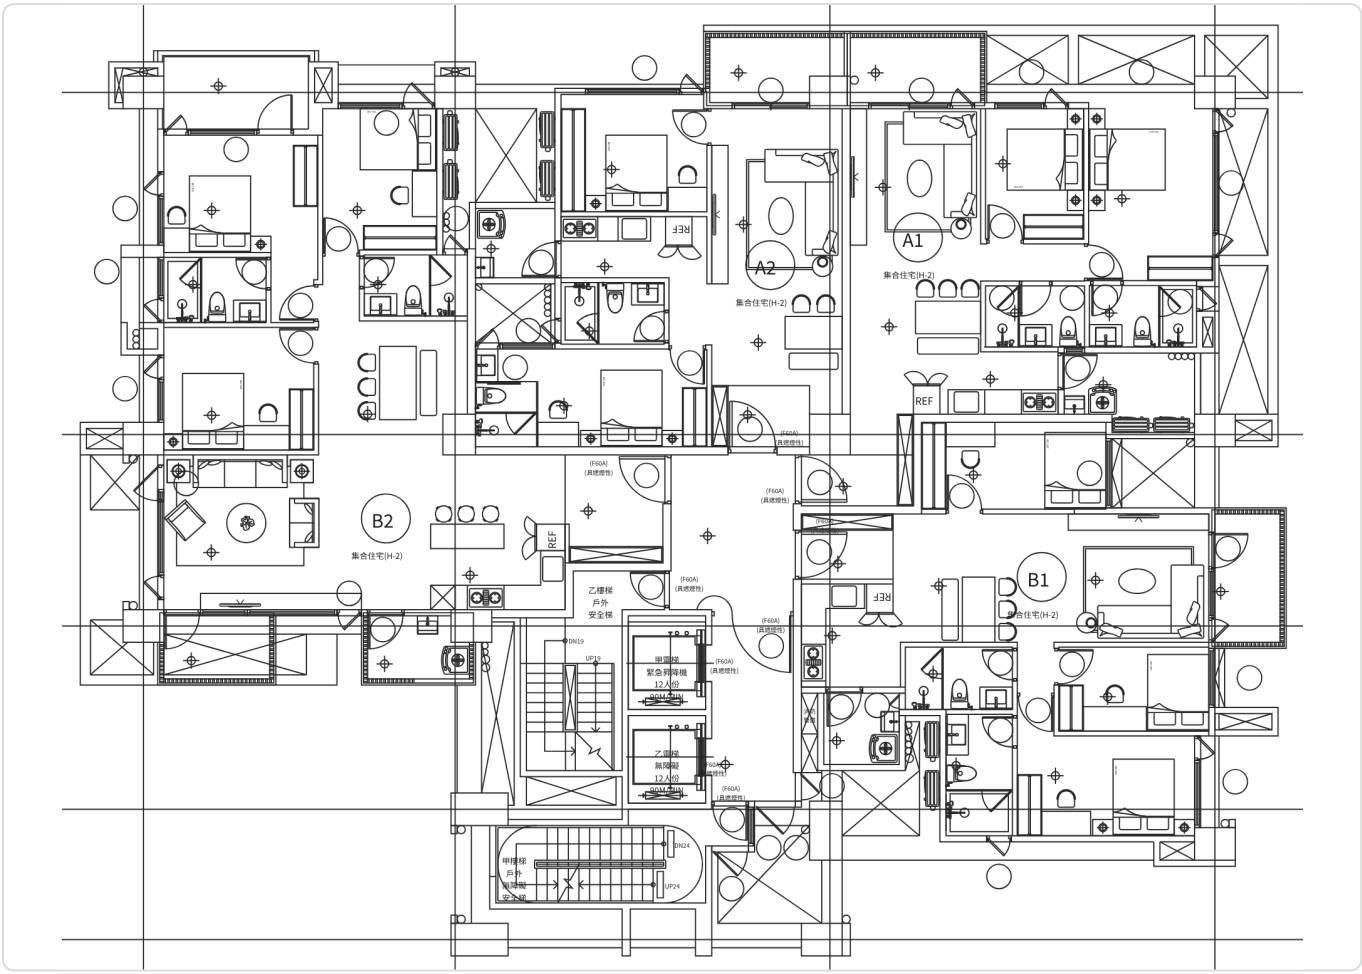


四、八、十二層平面（1/100 二工家配圖）。平面上方約為西向（指北針旋轉 285.6°，即北方朝圖面右側略偏上）。家具配置僅示意，對外使用前須依請照圖核對。

戶別	格局	室內 ㎡	室內坪	陽台 ㎡ (11 層平均)	預估權狀坪 示意	主要採光面 評估	戶數
A1	2房2衛	69.27	20.95	10.28	≈30.4	西＋北（角戶，近宜興路側）	11
A2	2房2衛	66.71	20.18	9.95	≈29.3	西（單面採光）	11
B1	3房2衛	79.27	23.98	9.97	≈34.1	北＋東（角戶）	11
B2	3房2衛	106.12	32.10	9.72	≈44.2	南＋西＋東（三面邊間）	11

室內面積取自面積計算表（A1 含 0.96 ㎡ 計入部分） 實際；預估權狀 =（室內＋陽台）÷（1−公設比 20.7%），公設比依下頁假設推算，正式數字以建商面積分配表為準。 示意

06 戶型解讀與面積結構

各戶坪數：室內 vs 預估權狀

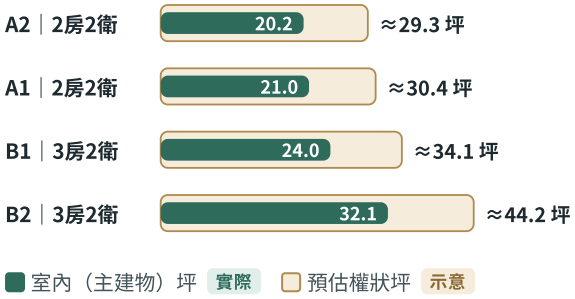

產品組合

兩房（A1、A2）	22 戶	50%
三房（B1、B2）	22 戶	50%
最小／最大室內	20.2 坪／32.1 坪	
衛浴	四種戶型皆 2 衛	

A2 為單面採光、A1／A2 主面朝西，西曬需靠遮陽板（3、5、7、9、11 層設透空遮陽板）、格柵與玻璃規格回應。B2 為三面採光邊間，是全案標竿戶。 評估

總面積組成（7,076.27 ㎡）



住宅專有（主建物＋陽台）
4,104 ㎡（58%）

共用部分（不含車位）
1,073 ㎡（15%）


停車相關（1F＋B1）
1,900 ㎡（27%）

總量 實際；拆分 示意：B1 停車以法規檢討採用之每車 40 ㎡ × 30 位 = 1,200 ㎡ 估算，其餘 B1 面積視為共用。據此推得：可售住宅約 **1,566 坪**、公設比約 **20.7%**（車位另計）、車位平均權狀約 **10.8 坪**。若車道與 B1 機房改按戶分攤，公設比將上升，需以建商面積分配表確認。

可主打　① 全平面車位 53 位、車位比 1.2　② 3.6 m 層高　③ 四戶一層、兩部電梯　④ 清水模＋木格柵立面　⑤ 退縮 12.4 m 綠帶前庭 評估

需補強　① 1F 無店面、大廳僅 72 ㎡　② A1／A2 西向　③ 合法公設少，賣點依賴二工　④ 未見機車位規劃　⑤ 多出 9 個車位的定價策略 評估

07 停車與公共空間

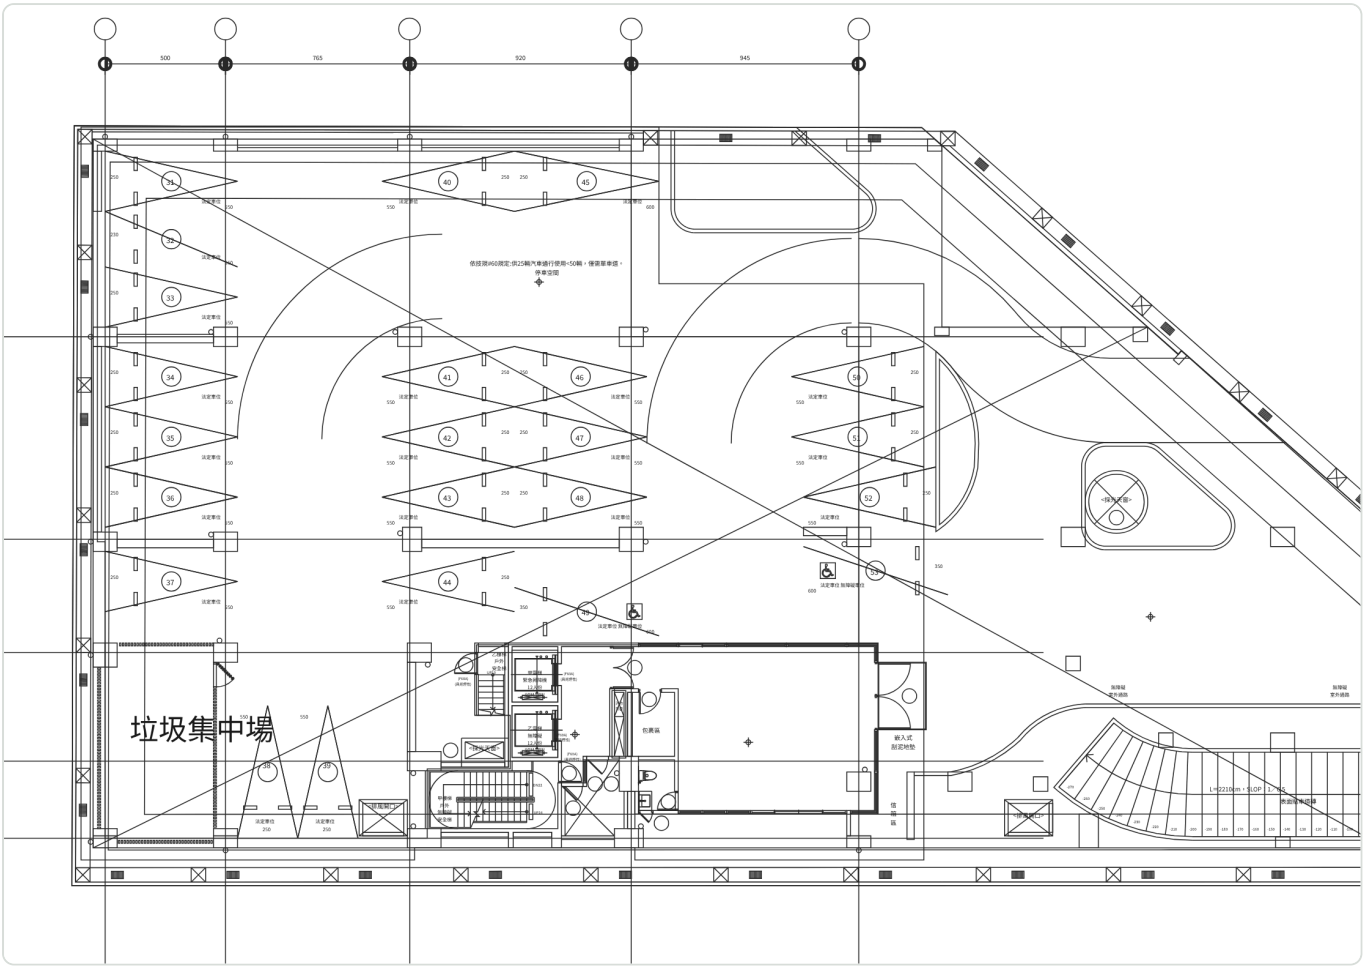

一層平面（1/100 二工家配圖）：法定／自設汽車位 31–53 號、單車道坡道（長 22.1 m，坡度 1/6.5）通往 B1、管委會空間規劃為接待大廳與包裹區。

停車	數量
B1 汽車位（防空避難室兼停車）	30
1F 汽車位	23
合計（法定 26＋自設 27）	**53**
其中無障礙車位（350×600 cm）	2
車位尺寸	250×550／230×550／250×600
機車位	圖說未見


公共空間（請照用途）	面積
1F 管委會空間	72.36 ㎡
1F 排煙室兼梯廳／電梯／安全梯／管道	36.95 ㎡
2F–12F 每層梯廳／電梯／安全梯／管道	45.35 ㎡
屋突一～三層（樓梯間、設備空間）	99.76 ㎡ ×3
B1 消防及發電機房、電信室、台電配電場所	—
2F 露台（1F 停車層屋頂）	—

數量與尺寸 **實際**。車位比 53／44 = 1.20；宜蘭市大樓少見全平面車位配置，建議車位定價與戶別綁售策略於定價階段一併決定。 **評估**

08 二工（二次施工）合規盤點

圖檔另有「29_二工」圖層與 1/100「二工家配」平面組，內容與請照用途不同。以下逐項比對，作為廣告與銷售話術的合規底線。

位置	請照圖用途 實際	二工家配圖標示 實際	風險 評估	建議做法 評估
屋突一層	樓梯間、屋頂平台	交誼廳／媽媽教室、儲物間	高	不列入公設文宣；若要室內公設，先由建築師評估變更設計可行性
屋突二層	設備空間	視聽間／棋藝室、開放式健身房、廁所、儲物間	高	同上；健身機能可改放合法共用空間，或規劃為不加頂蓋的屋頂活動平台
1F	管委會空間 72.36 ㎡	接待大廳、包裹區	低	屬共用空間的使用安排；文宣並列法定用途「管委會空間」，由規約約定
1F	停車空間周邊	垃圾集中場	中	確認未占用法定車位、車道或法定空地；必要時納入正式設計
B1	防空避難室兼停車空間、機房區	洗衣間	中	防空避難範圍不宜固定隔間；改設合法空間或以設備區說明
2F	露台（1F 停車層屋頂）	開心農場（露台）	低	活動式植栽可行；不加蓋、不圍閉；荷重與防水由結構技師確認
3F–12F B2 戶	以 × 標示之透空構架／遮陽	陽台（設門可出入）	中	請建築師確認差異；對外平面不得將非陽台空間標為陽台或室內

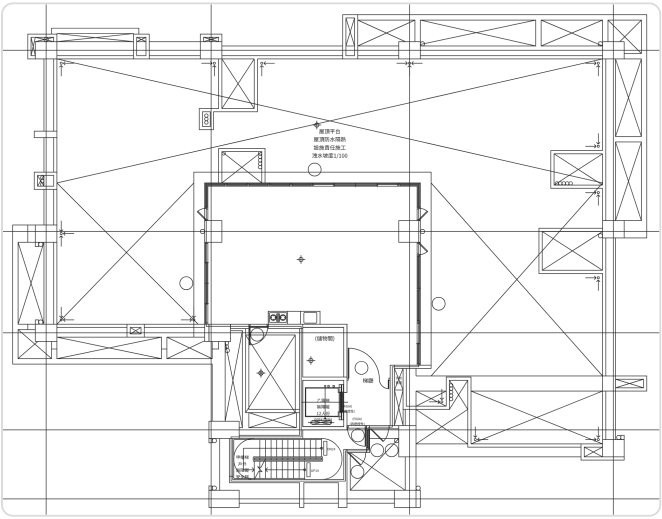

屋突一層（二工家配）：中央室內空間標示為「交誼廳／媽媽教室」，請照用途為樓梯間／屋頂平台。

法規依據與實務　公平交易法第 21 條禁止對商品為虛偽不實或引人錯誤之表示。公平會歷年處分案中，將陽台、機電空間、露臺、水箱間等以室內空間表示於家具配置圖者，曾分別處 40–50 萬元罰鍰；另有「廣告坪數含二次施工違章建築」之處分。

本案建議　①對外家配圖一律以請照圖為底，二工內容不入廣告　②屋突公設若要成為賣點，先評估變更設計或改以合法空間承載　③銷售人員話術與書面一致，不口頭承諾二工　④本頁法律判斷需專業人士最終確認。

09 產品力評估

優勢

- 宜蘭市都市計畫住宅區，臨 12M 已開闢道路
- 44 戶小規模、四戶一層、兩部電梯
- 53 個平面汽車位，車位比 1.2
- 層高 3.6 m、戶外安全梯、分戶隔音樓板
- 清水模＋木色鋁格柵立面，識別度高
- 塔樓退縮 12.4 m，喬木 21 株的前庭

待補強

- 1F 以停車為主，入口門面需設計加值
- A1／A2 西向、A2 單面採光
- 合法公設僅管委會空間與屋頂平台
- 機車位、自行車位未見規劃
- B1 洗衣間、垃圾集中場位置需與法定用途核對
- 三角形基地斜邊，需景觀轉化


風險

- 二工內容入廣告的公平法風險
- 建照仍在請照階段，預售時程受核照影響
- 契約備查前刊登廣告或收訂即違規（平均地權條例）
- 宜蘭縣 2025 首季預售屋解約量居全國第五（媒體報導），價格需保守
- 地質改良與開挖支撐增加工期與成本變數

建議定位假說（待市調驗證） 評估

客群假說	對應戶型	需要驗證的數據
宜蘭市在地首購／小家庭（雙薪）	A1、A2 兩房	宜蘭市 2 房大樓實登總價帶、首購貸款成數
在地換屋（透天換電梯）	B1、B2 三房＋車位	宜蘭市透天中古成交量、換屋客年齡層
返鄉族／雙北置產	B2 邊間、A1 角戶	國道 5 號通勤客比例、春節檔來客結構

10 銷售企劃時程建議

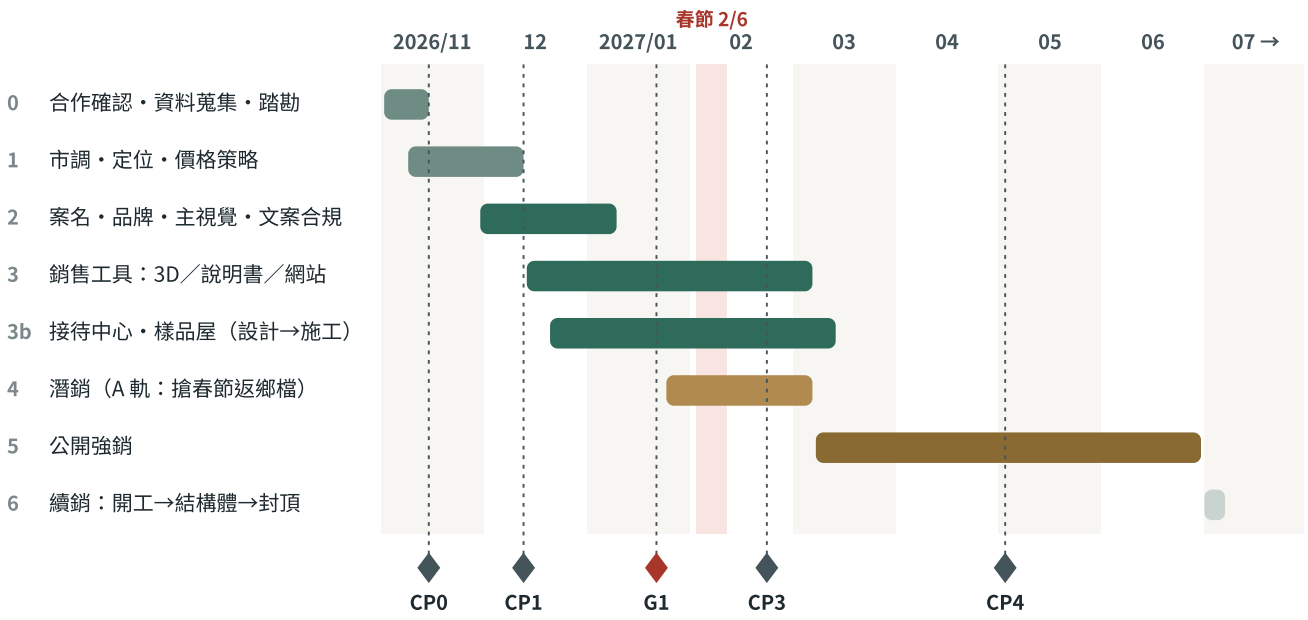

A 軌（建議） 建照於 2026/12 核發 → 2027/01 下旬完成預售契約與建案資訊備查（G1）→ 1/25 起潛銷，覆蓋 2027 春節返鄉人潮 → 3/8 公開。

B 軌（建照延後） 建照晚於 2026/12/31 → 潛銷順延至清明連假後（2027/04 中），公開 2027/05–08；Phase 0–3 照常推進，銷售工具提前完成可縮短等待。

檢查點	時間 示意	通過條件 示意	未通過的動作	承接人
CP0 資料到位	2026/11/15	P1 資料到位 ≥ 80%	暫停 Phase 1 以外工作，重排時程	璞域專案經理
CP1 定位定價共識	2026/12/13	客群、產品組合、價格區間三項書面確認	視覺製作延後開工	建商負責人＋璞域企劃總監
G1 法規閘門	2027/01/22	建照核發＋預售契約與建案資訊備查（委託代銷者另需代銷備查）	不得刊登任何廣告、不收訂	建商法務／地政士
CP3 潛銷檢查	潛銷第 4 週	有效來客 ≥ 100 組、意向登記 ≥ 25 組	調整價格帶、付款條件或主打戶型	璞域企劃總監
CP4 公開檢查	公開第 8 週	成交 ≥ 13 戶（30%）	啟動價格與通路檢討	建商負責人＋璞域企劃總監

11 階段交付物與分工

階段	主要交付物	璞域承接人	建商配合
0 合作確認 11/02–11/15	合作範疇與分工表、資料需求清單追蹤、基地踏勘紀錄（交通、學區、嫌惡設施、景觀）	專案經理	專案窗口提供 P1 資料
1 市調定位 11/09–12/13	宜蘭市電梯大樓 24 個月實價登錄分析、競品 10 案比較、客群假說驗證、價格策略三情境、車位定價、產品微調建議	企劃總監	決策者參與定位會議
2 品牌視覺 11/30–01/10	案名提案、主視覺、字標、文案庫、廣告合規檢核表（二工切割、示意圖標示）	設計主管＋文案	案名與主視覺拍板
3 銷售工具 12/14–03/07	3D 外觀與公設示意、合規版家配圖、全案說明書、建材設備表、網站／Landing Page、DM、影片腳本	設計主管	建築 3D 模型、建材表、工務確認
3b 接待中心 12/21–03/14	接待中心選址比較、動線與樣品屋規劃、施工監造	專案經理	選址決策、預算核定
G1 法規閘門 ≤ 01/22	廣告素材合規總檢、銷售話術手冊	企劃總監	建照、契約備查、履約保證、代銷備查
4–5 潛銷・公開 01/25–06/30	媒體投放計畫與週報、來客分析、去化與價格追蹤、CP3／CP4 檢討報告	企劃總監＋數位	銷售現場、成交資料回傳
6 續銷 2027/07 →	工程進度行銷（開工、結構體、封頂）、餘屋策略	專案經理	工程節點照片與資訊

工期提醒　地下 1 層、地上 12 層 RC，含地質改良與開挖支撐，一般工期約 30–36 個月（自開工起算），成屋交屋約落在 2030 年。續銷期長，建議以工程節點作為行銷節奏，並預留價格調整機制。 評估

12 希望建商提供的資料（一）

依急迫性分三批。**P1 一週內**（決定定位與時程）、**P2 三週內**（製作銷售工具）、**P3 公開前**（契約與說明書）。另附可編輯追蹤表（試算表）。

P1 一週內：定位與時程的前提

#	資料項目	用途	格式	建商承接人
1	**建照狀態（字號與核發日，或審查進度與預計核發日）**	決定 G1 法規閘門與 A／B 軌	文件影本	建商專案窗口
2	**最新版完整圖說（建築、結構、水電、消防、景觀）與變更紀錄**	確認本次解析圖檔是否為最終版	DWG＋PDF	建築師事務所
3	**面積分配表（主建物／附屬建物／共有部分／車位）**	權狀坪、公設比、車位坪數定案	試算表	建商專案窗口＋建築師
4	**土地謄本與合作架構（向信／璇翔分工、簽約主體、決策權）**	確認簽約主體與核決流程	文件	建商負責人
5	**二工規劃清單與意圖（屋突公設、1F 大廳、B1 洗衣間、2F 露台、B2 陽台）**	合規切割與公設賣點策略	清單＋圖	建商負責人＋建築師
6	**營建計畫（營造廠、預計開工日、工期、工程款節點）**	續銷節奏與付款條件設計	時程表	建商工務主管
7	**價格與財務目標（目標總銷、底價區間、車位價格、銷售預算）**	價格策略與預算配置	簡表	建商負責人
8	**銷售模式（自售或委託代銷）與接待中心預定地**	分工與接待中心規劃	說明	建商負責人

13 希望建商提供的資料（二）

P2 三週內：銷售工具製作

#	資料項目	用途	格式	建商承接人
9	**建材設備表（外牆、門窗玻璃、廚具、衛浴、地坪、空調、電梯、弱電／智能）**	說明書、樣品屋、銷售話術	試算表／型錄	建商工務主管
10	**建築 3D 模型與外觀材料樣板（清水模、木色格柵、塗料色號）**	3D 示意圖與影片	SKP／RVT／實樣	建築師事務所
11	**景觀與照明設計（前庭、入口、21 株喬木）**	前庭賣點視覺化	圖說	建築師／景觀設計
12	**公設與管理規劃（管委會空間用途、物業保全、管理費預估、垃圾處理）**	生活服務說明	說明	建商專案窗口
13	**車位配置與分配原則（大小車位、無障礙位、機車位有無）**	車位定價與綁售策略	圖＋表	建商專案窗口
14	**地質鑽探、地質改良與結構系統摘要**	結構安全說明素材	報告摘要	建商工務主管＋結構技師
15	**起造人品牌資料（公司簡介、過往實績、LOGO）**	品牌信任背書	檔案	建商專案窗口
16	**既有名單與在地通路（舊客、地主、合作仲介）**	潛銷名單（依個資法取得同意）	名單	建商負責人

P3 公開前：契約、說明書與售後

#	資料項目	用途	格式	建商承接人
17	**預售屋買賣契約草案與履約保證方式**	備查文件與說明書一致	文件檔	建商法務／地政士
18	**付款辦法（訂金、簽約金、工程期款、交屋款）**	價目表與付款試算	表格	建商負責人
19	**交屋標準與保固條款（結構、防水、設備）**	說明書保固用語合規	文件	建商工務主管
20	**客變規則（範圍、截止點、費用）**	客變說明與銷售話術	文件	建商工務主管
21	**鄰地與周邊資訊（30M 道路標註、鄰地開發、嫌惡設施）**	區位風險揭露	說明	建商專案窗口

14 附錄：資料來源與限制

資料來源與解析方式

- 來源檔：建商提供之請照圖 DWG（2000 版格式，16.2 MB），建立日 2025/08/29，最後修改 2026/09/29。
- 解析：讀取 70,048 個模型空間物件與 2,426 個圖塊，擷取 12,080 筆文字（含屬性），依圖層與座標比對樓層。
- 平面、立面圖片由向量圖直接輸出，未經重繪；家具與二工內容依原圖層呈現。
- 方位依一層平面圖指北針圖塊旋轉角（285.6°）推算，並與地籍配置圖之道路走向交叉核對。
- 市場數據（宜蘭縣預售屋解約量）為媒體報導，未納入任何價格推算。

圖說內容索引（共 14 類）

圖例／索引／位置圖／地籍圖／配置圖、法規檢討與面積計算表、建築陰影、北向日照、綠化檢討、地下一層至屋突頂層平面圖、東西南北立面圖、長向剖面（一）（二）、短向剖面、車道剖面、門窗圖（一）～（四）、避雷針與電梯詳圖、無障礙設施地圖、專有共用圖、各層結構平面圖、地質改良、開挖支撐、觀測系統、1/100 二工家配平面組

本文件的限制

- 本文件以單一請照圖檔為基礎，未取得建照、面積分配表、建材表與價格資料；所有 示意 數字待建商資料到位後於 v1.1 修正。
- 二工合規與預售屋法規相關段落為企劃端風險提示，法律結論需專業人士（律師／地政士）最終確認。
- 立面與平面圖片皆為設計圖面，非完工實景；對外使用時須標示「示意」。
